النشرة نصف الشهرية للمياه والإصحاح البيئي - سوريا
شبكة الإنذار المبكر والإستجابة

التاريخ: 31 كانون الأول - 13 كانون الثاني 2024 **الأسبوع رقم: 01-02**

العناوين الرئيسية

- بلغ عدد محطات مياه الشرب العامة التي يقوم فريق المياه والإصحاح البيئي (WASH) في شبكة الإنذار المبكر والإستجابة بمراقبتها في 6 محافظات 1331 محطة، منها 1111 محطة قرى/بلدات/مدن و220 محطة مخيمات.
- نسبة 73% (969/1331) من المحطات كانت تعمل بينما 27% (362/1331) من المحطات كانت لاتعمل.
- نسبة 23% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب عدم وجود نفقات تشغيل، في حين أنّ نسبة 25% من المحطات المتوقفة متوقفة بسبب الحاجة الى صيانة كاملة.
- نسبة 33% من المحطات تعتمد على شبكة الكهرباء، بينما نسبة 30% من المحطات تعتمد على مولدات كمصدر للطاقة التشغيلية بينما باقي المحطات تعتمد على مصادر أخرى (مزيد من التفاصيل في الأسفل)
- في المناطق التي تعتمد على محطات -متوقفة حاليا- تعتبر الآبار الزراعية الخاصة المصدر البديل ويتم استخدام الصهاريج كوسيلة لنقل المياه.
- بلغت نسبة المحطات العاملة التي يتم تعقيم المياه فيها 64% (616/969).
- في المحطات العاملة يتم إيصال المياه إلى المواطنين باستخدام الشبكات النظامية بنسبة 88% (841/969) وباستخدام الصهاريج بنسبة 08% (63/969) وباستخدام الشبكة والصهاريج معا بنسبة 04% (60/969) وباستخدام المناهل بنسبة 01% (5/969).
- تم إجراء 5 اختبار نوعية مياه، حيث وجد أن 2 منها كانت ملوثة.

خريطة تغطية شبكة الإنذار المبكر والاستجابة

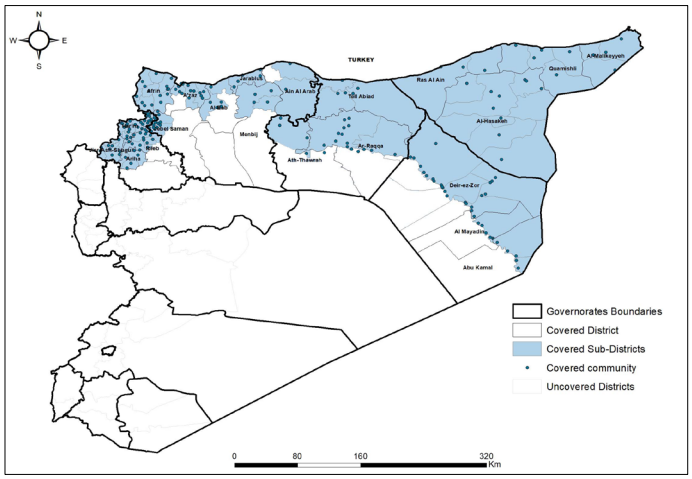

تغطية فريق المياه والإصحاح البيئي

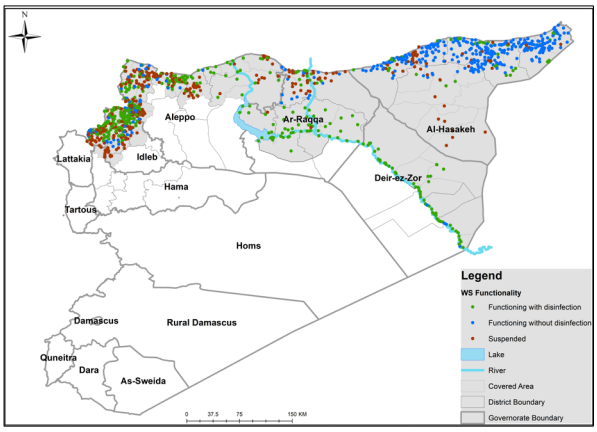

يغطي فريق المياه والإصحاح البيئي **77** ناحية، **23** منطقة في **6** محافظات

الاكتمالية والموقوتية للتقارير نصف الشهرية

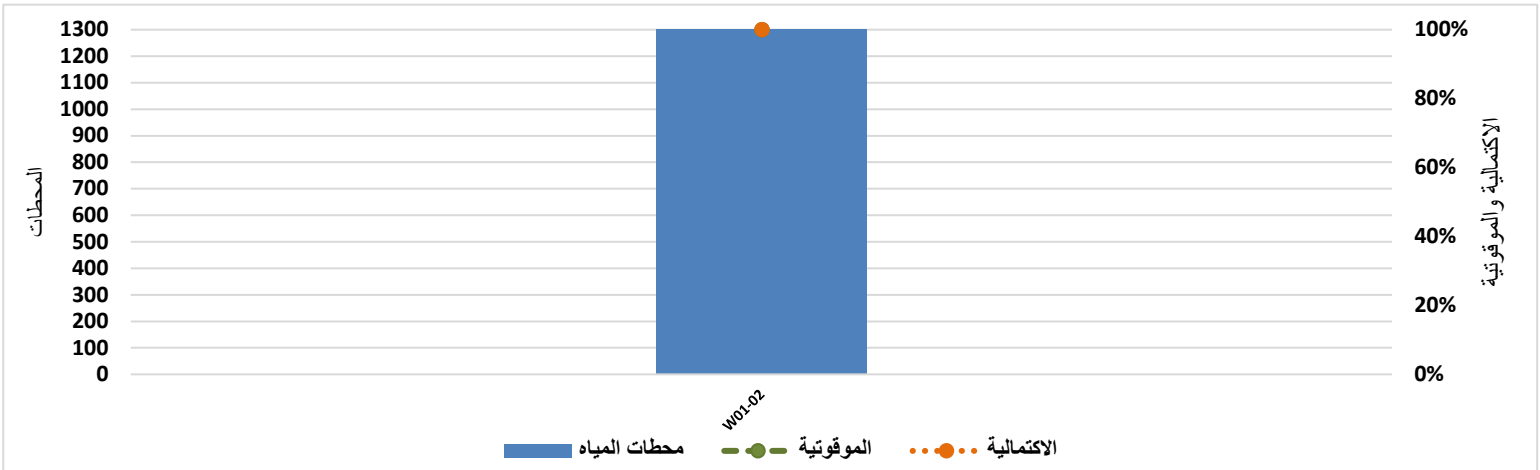

محطات مياه الشرب في المحافظات

المحافظة	محطات مياه السيرب		
	عدد المحطات	تعمل	النسبة
حلب (بلدات)	262	149	57%
حلب (مخيمات)	51	21	41%
إدلب (بلدات)	231	153	66%
إدلب (مخيمات)	169	121	72%
حماة	8	0	0%
الرقة	122	94	77%
دير الزور	61	58	95%
الحسكة	427	373	87%
الكلي	1331	969	73%

المحافظة	محطات مياه السيرب العاملة		
	عدد المحطات	معقمة	النسبة
حلب (بلدات)	149	132	89%
حلب (مخيمات)	21	16	76%
إدلب (بلدات)	153	139	91%
إدلب (مخيمات)	121	84	69%
حماة	0	0	0%
الرقة	94	78	83%
دير الزور	58	55	95%
الحسكة	373	112	30%
الكلي	969	616	64%

محطات مياه الشرب في المحافظات

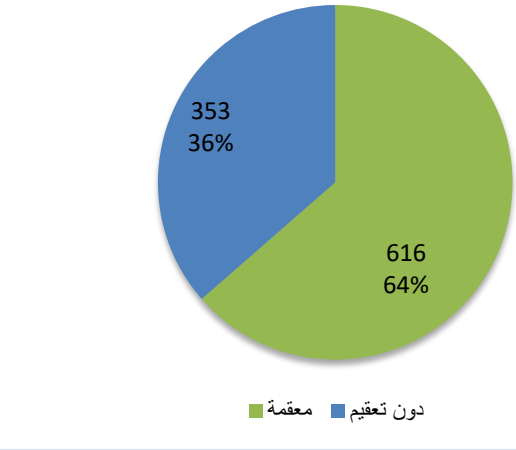

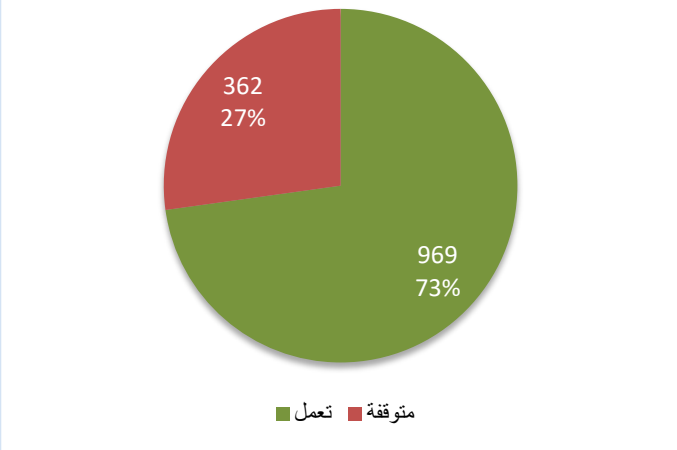

الوضع التشغيلي لمحطات مياه الشرب

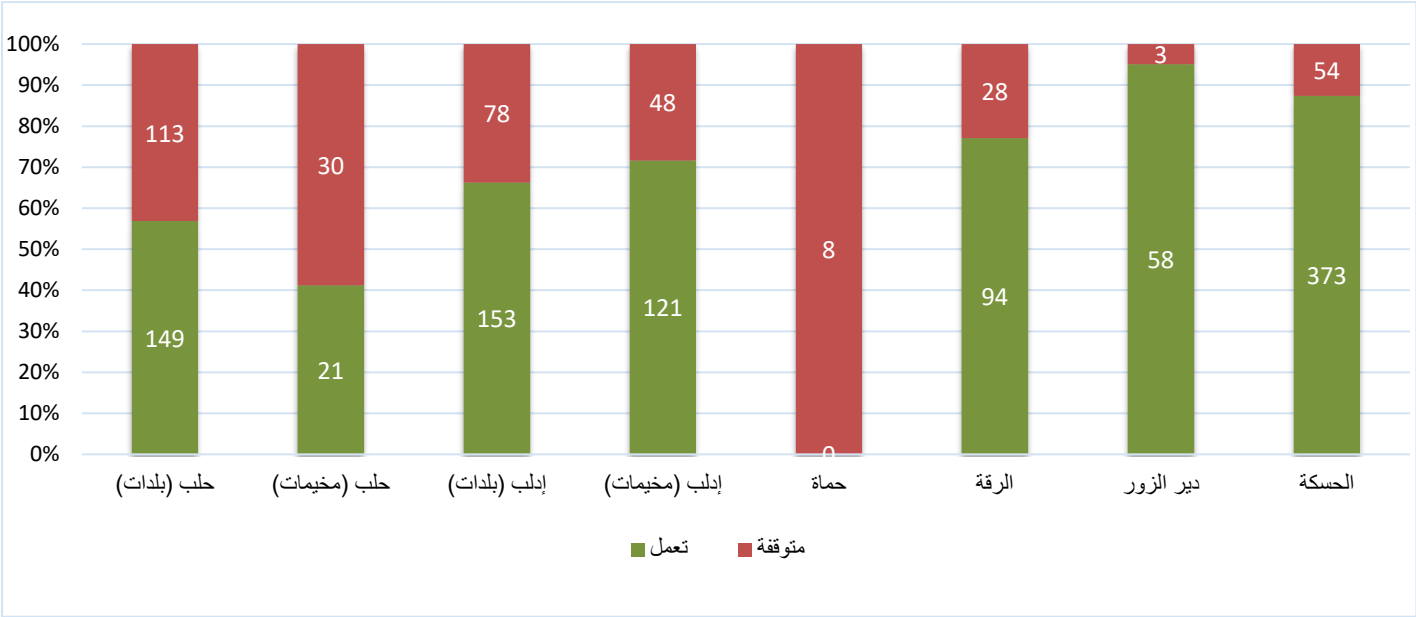

سبب توقف المحطة

المحافظة	توقف مؤقت	عدم توفر كلفة تشغيلية	المحطة قيد الصيانة	المحطة بحاجة لصيانة بسيطة	المحطة بحاجة لصيانة متوسطة	المحطة بحاجة لصيانة كاملة	الوضع العسكري	المحطة مدمرة
حلب	24	32	3	5	22	41	9	6
إدلب	9	42	2	11	10	38	11	3
حماة	0	0	0	0	0	0	8	0
الرقة	1	6	0	3	5	4	9	0
دير الزور	0	0	0	0	0	1	2	0
الحسكة	18	3	2	0	1	5	23	2
الكلي	52	83	7	19	38	89	62	11

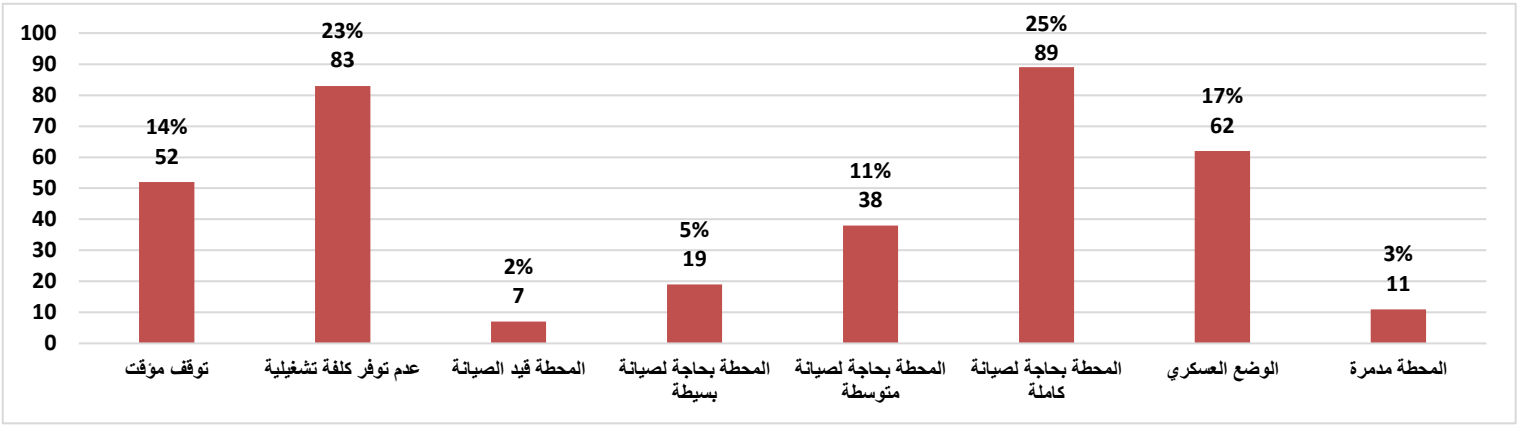

مصدر الطاقة الكهربائية

المحافظة	شبكة كهرباء	مجموعة توليد	طاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد	شبكة كهرباء وطاقة شمسية	مجموعة توليد وطاقة شمسية	شبكة كهرباء ومجموعة توليد وطاقة شمسية
حلب	21	163	15	45	4	44	21
إدلب	9	209	34	56	4	71	17
حماة	0	8	0	0	0	0	0
الرقة	76	2	5	29	0	6	4
دير الزور	0	12	0	49	0	0	0
الحسكة	336	3	0	66	13	0	9
الكلي	442	397	54	245	21	121	51

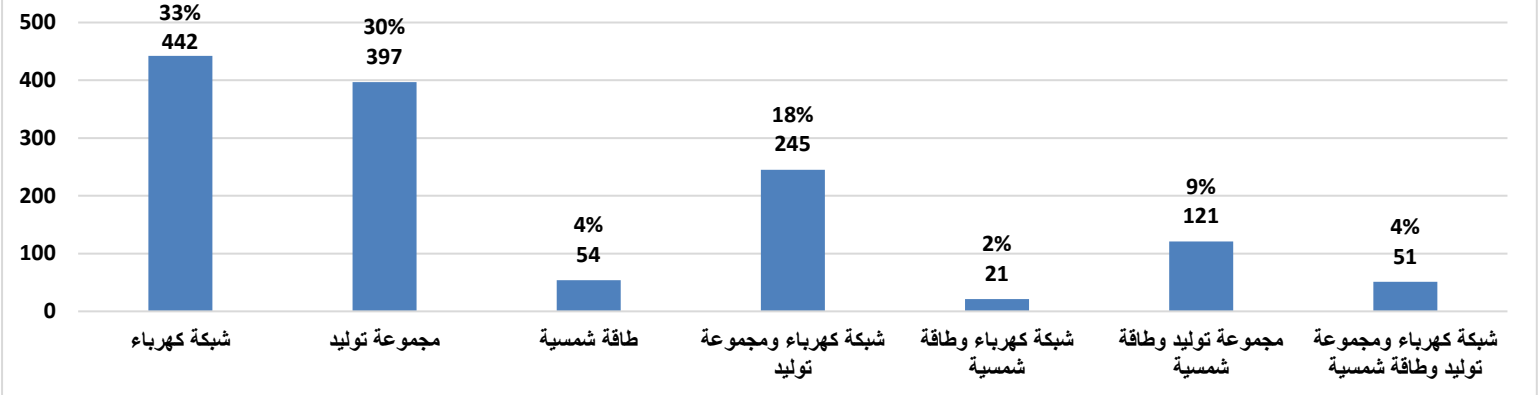

وضع التعقيم في محطات مياه الشرب العاملة

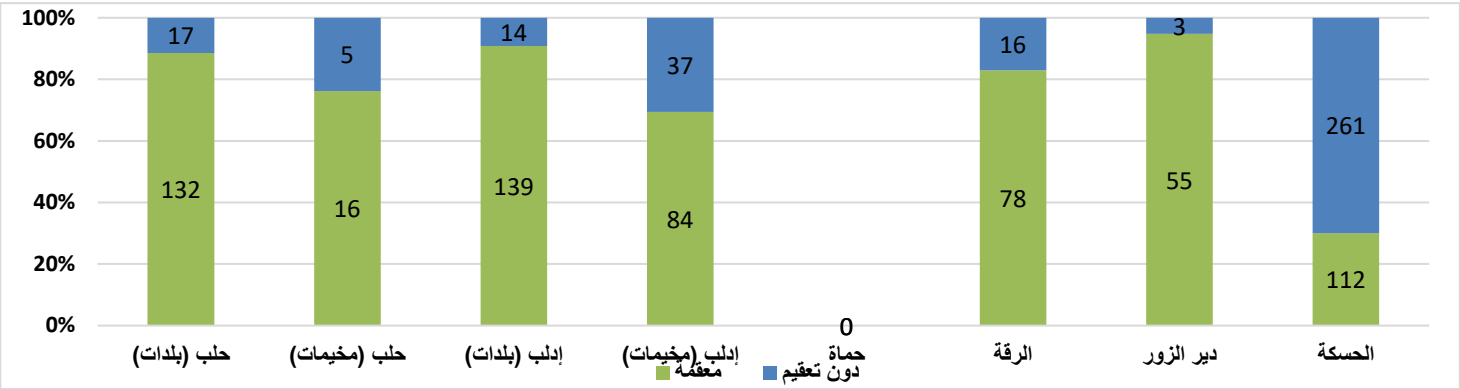

سبب عدم التعقيم في المحطات العاملة

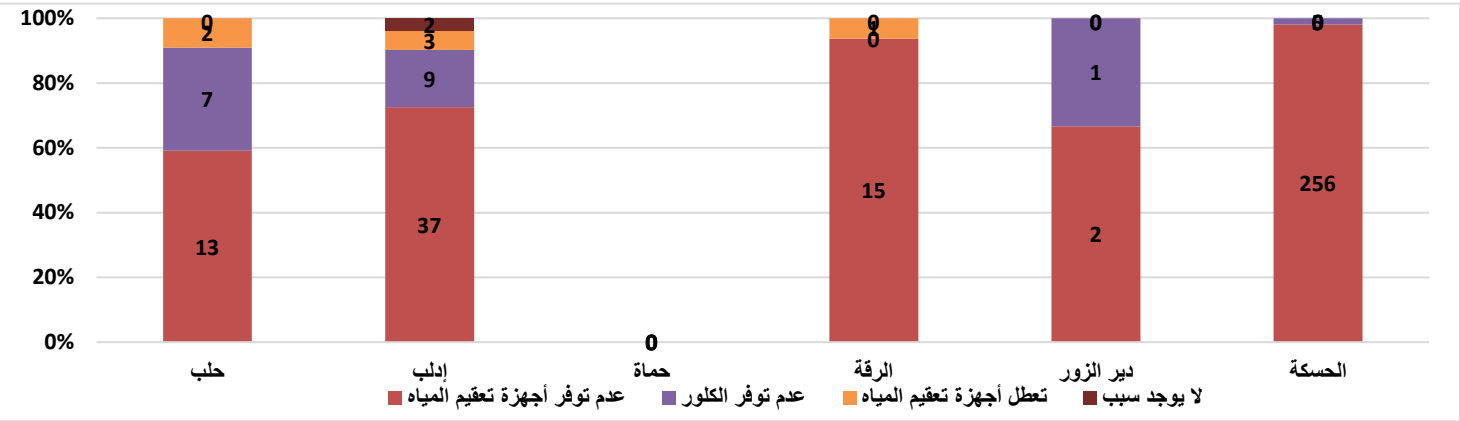

الوضع التعقيمي لكل محافظة خلال الأسابيع

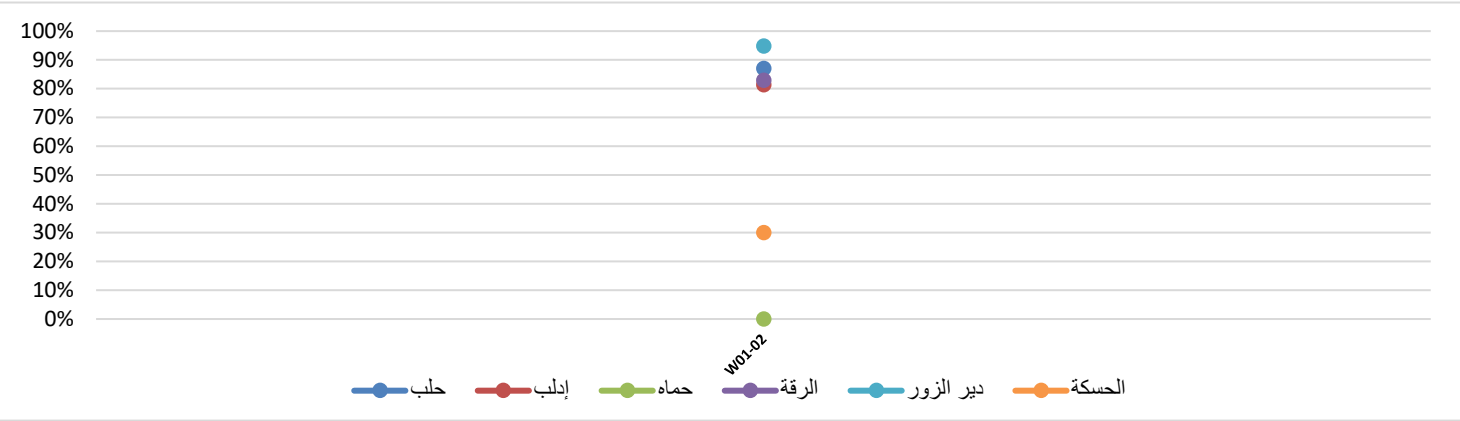

طريقة إيصال المياه

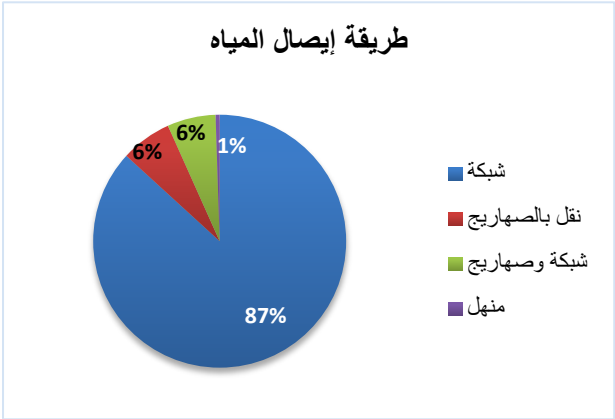

المحافظة	المحطات العاملة	طريقة إيصال المياه			
		شبكة	نقل بالصهاريج	شبكة وصهاريج	منهل
حلب	170	149	2	14	5
إدلب	274	176	54	44	0
حماة	0	0	0	0	0
الرقة	94	91	2	1	0
دير الزور	58	54	4	0	0
الحسكة	373	371	1	1	0
الكلي	969	841	63	60	5

توزع محطات مياه الشرب في محافظة حلب (محطات البلدات)

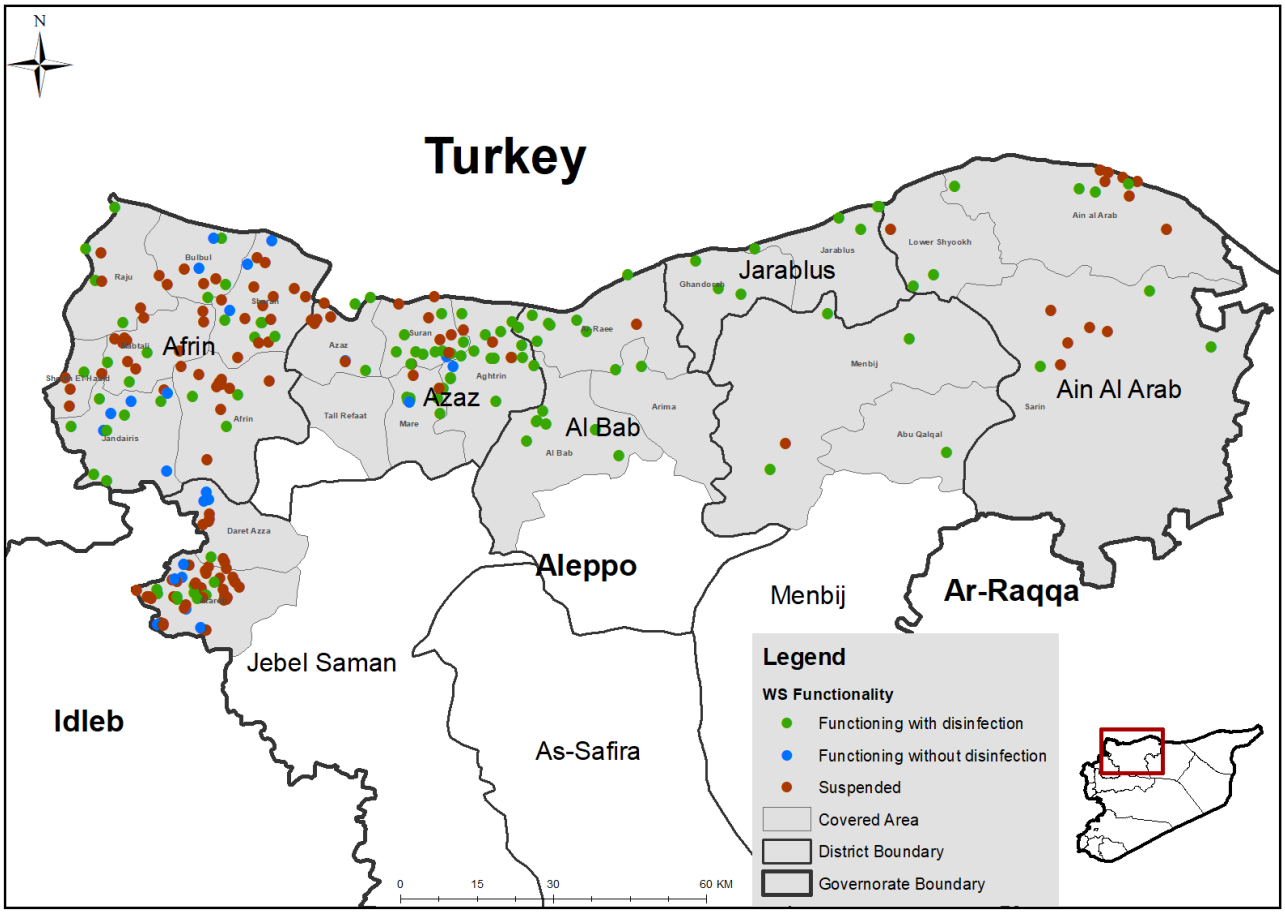

توزع محطات مياه الشرب في محافظة حلب (محطات المخيمات)

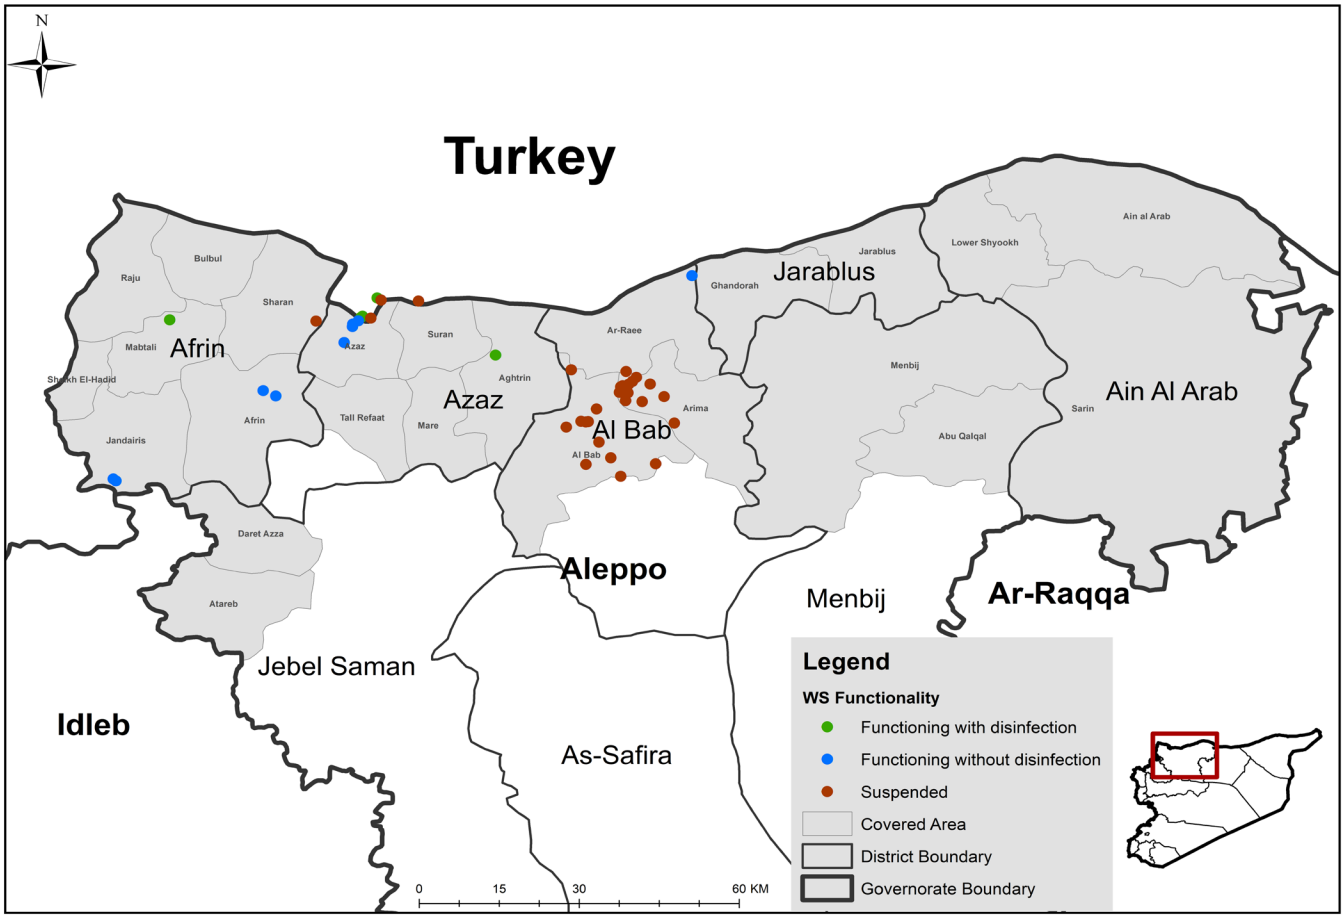

توزع محطات مياه الشرب في محافظة إدلب (محطات البلدات)

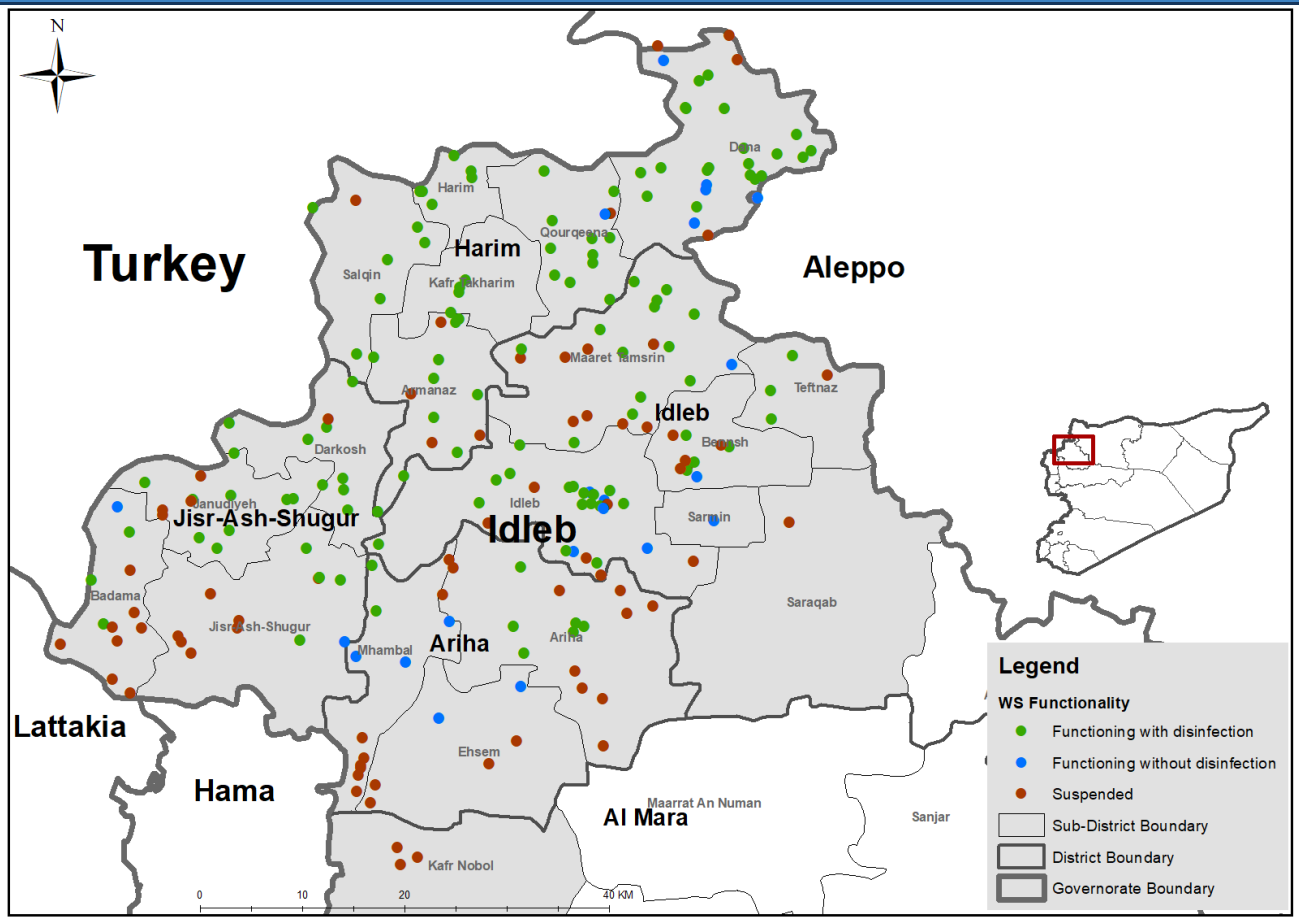

توزع محطات مياه الشرب في محافظة إدلب (محطات المخيمات)

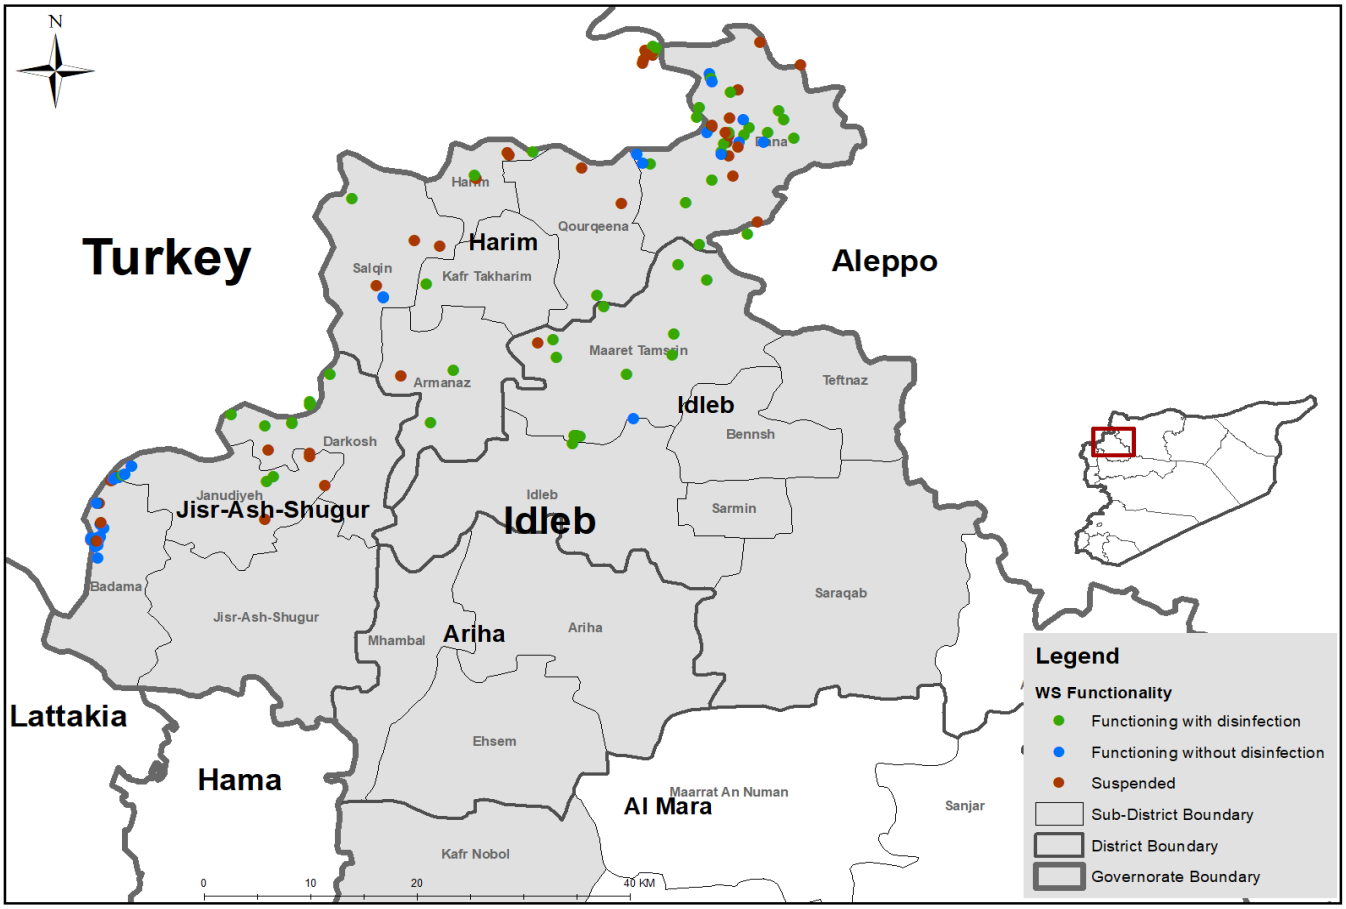

توزع محطات مياه الشرب في محافظة حماة

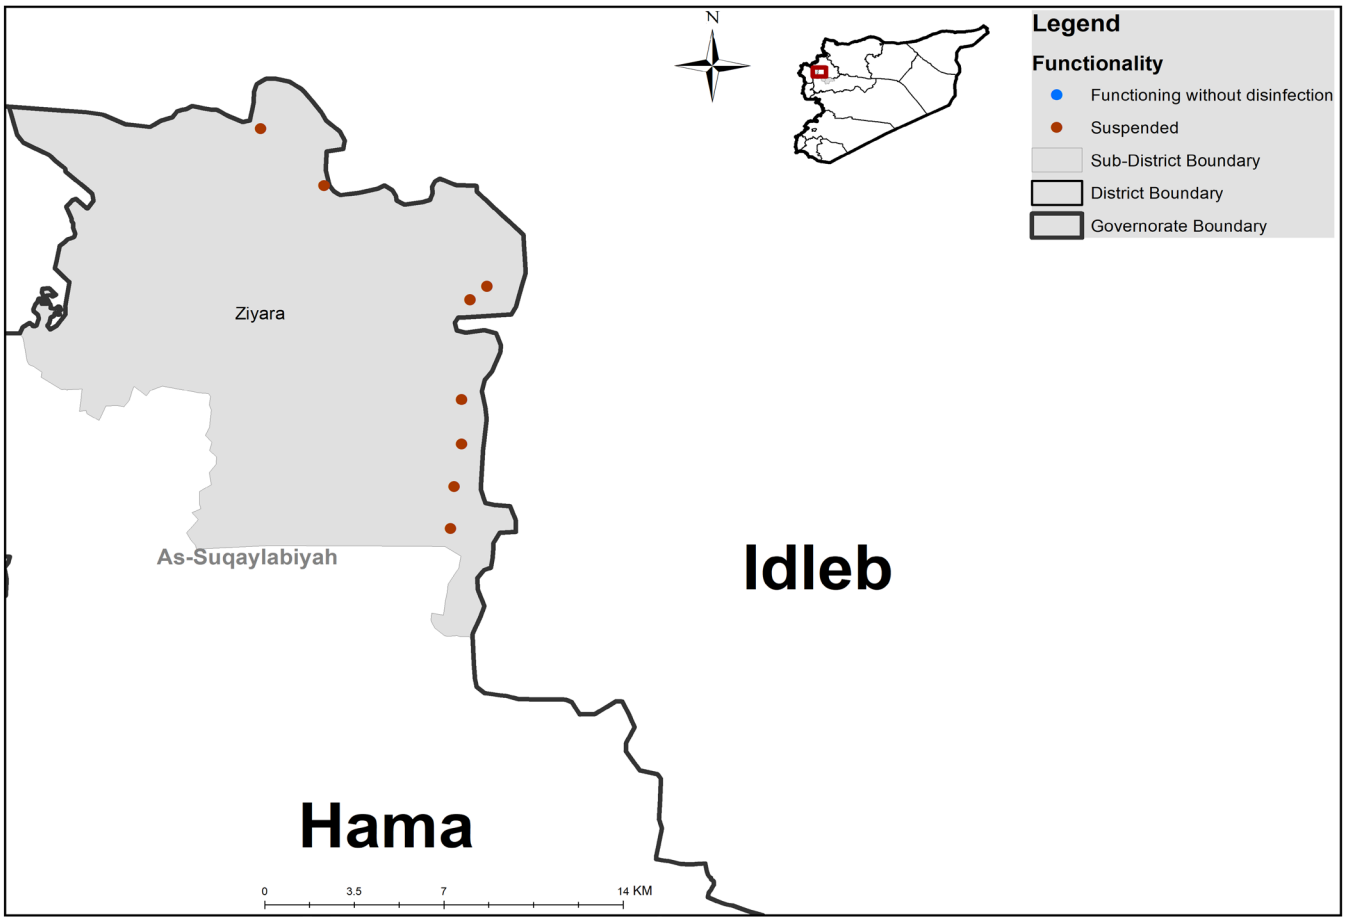

توزع محطات مياه الشرب في محافظة الرقة

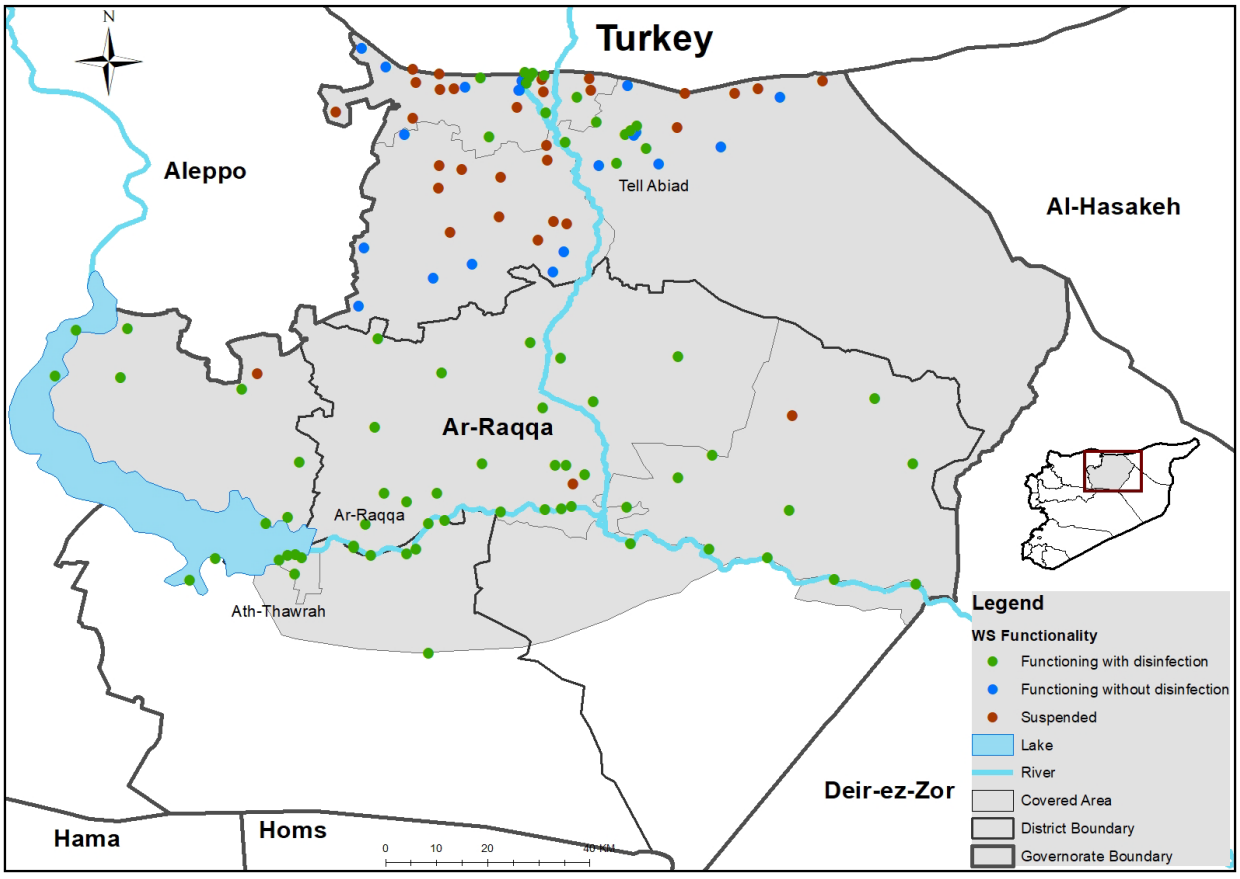

توزع محطات مياه الشرب في محافظة دير الزور

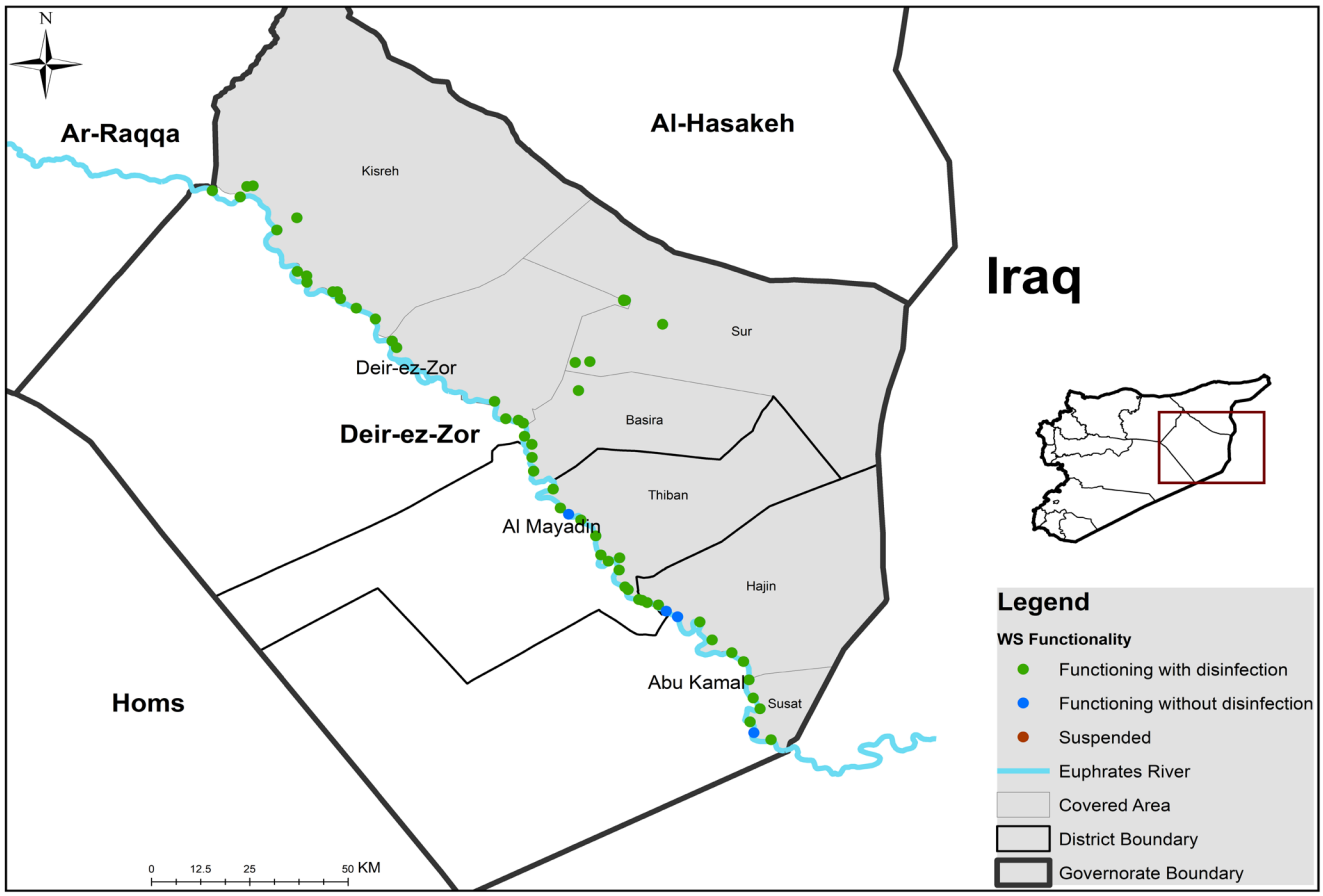
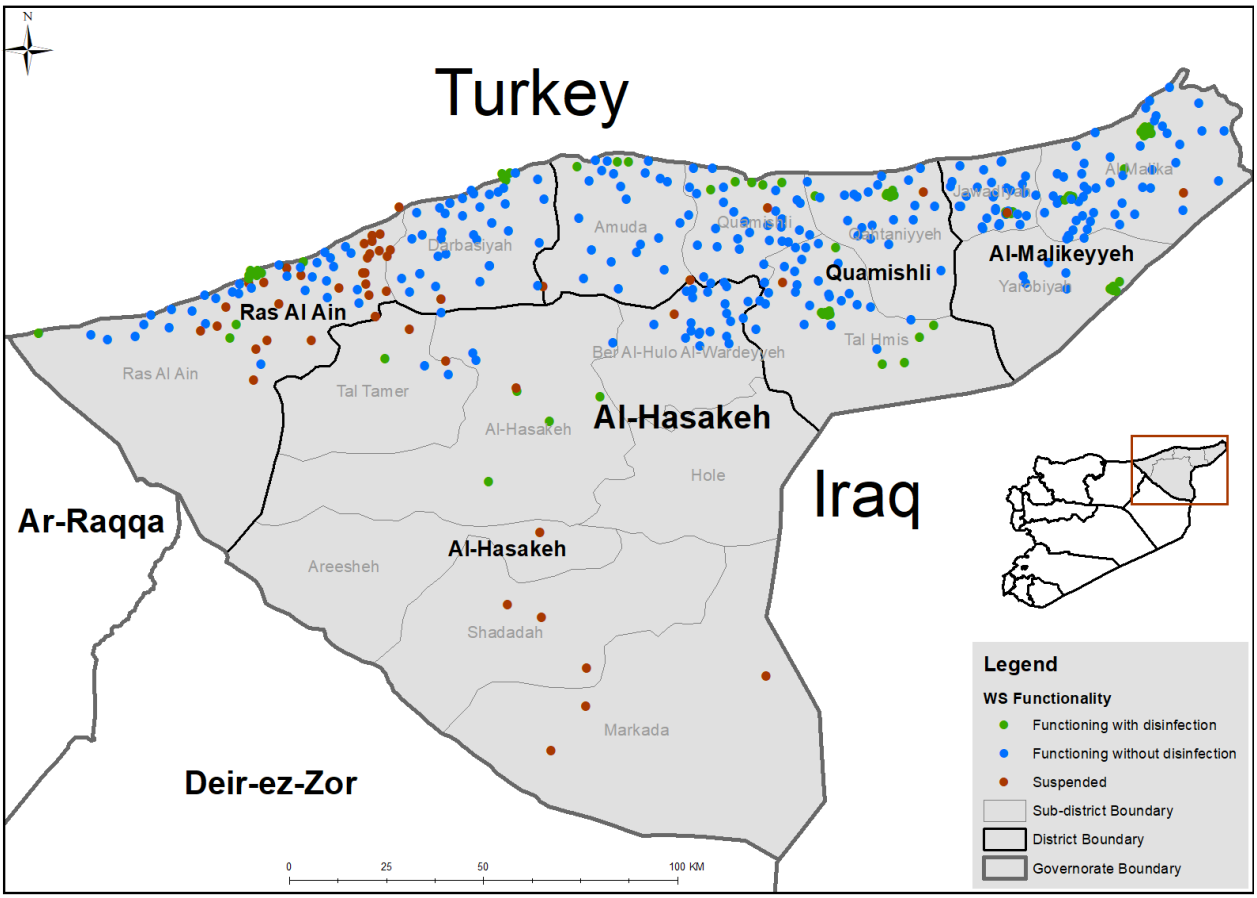
توزع محطات مياه الشرب في محافظة الحسكة
